


	Travaux du côté gauche		Pose des Poteaux et ancrages		CDM
	Travaux du côté droit		Armement		Trémie
	Installations de chantier / Balisage		Tirage et réglage de la LAC		Revêtement PF
	Terrassement		Tirage feeder		Espaces verts
	Déviations de réseaux		Pose des Equipements APS		Connexion EDF
	Trottoirs, espace piétonniers, ...		Câblage des Equipements APS		Mise sous tension énergie traction
	Chaussées		Localisation des carrefours anticipés		Essais sous-systèmes
	Multitubulaire		Traitement des carrefours par front dédié		Formation des conducteurs
	Plateforme tramway (GC)		Localisation des carrefours SLT		Essais système
	Pose de voie ferrée standard		Traitement des carrefours par front dédié SLT		Marche à blanc
	Pose de voie ferrée Apitrack		Sous-stations - Gros Œuvre		Période chômée
	Equipement de la voie ferrée		Sous-stations - Second Œuvre		1ère circulation
	Pose de voie ferrée sur ovoïde		Sous-stations/LSI - Equipement		Essais tramway sur site
	Pose des appareils de voie ferrée		Installations des quais des stations		Equipements TIS
	Pose de la voie ferrée sur ouvrage		Equipement et mise en place des abris des stations et équipements associés		Mise en service commercial
	Travaux sur ouvrage d'art				
	Tirage de cables BT		Démolitions		
			Déplacement monument historique		

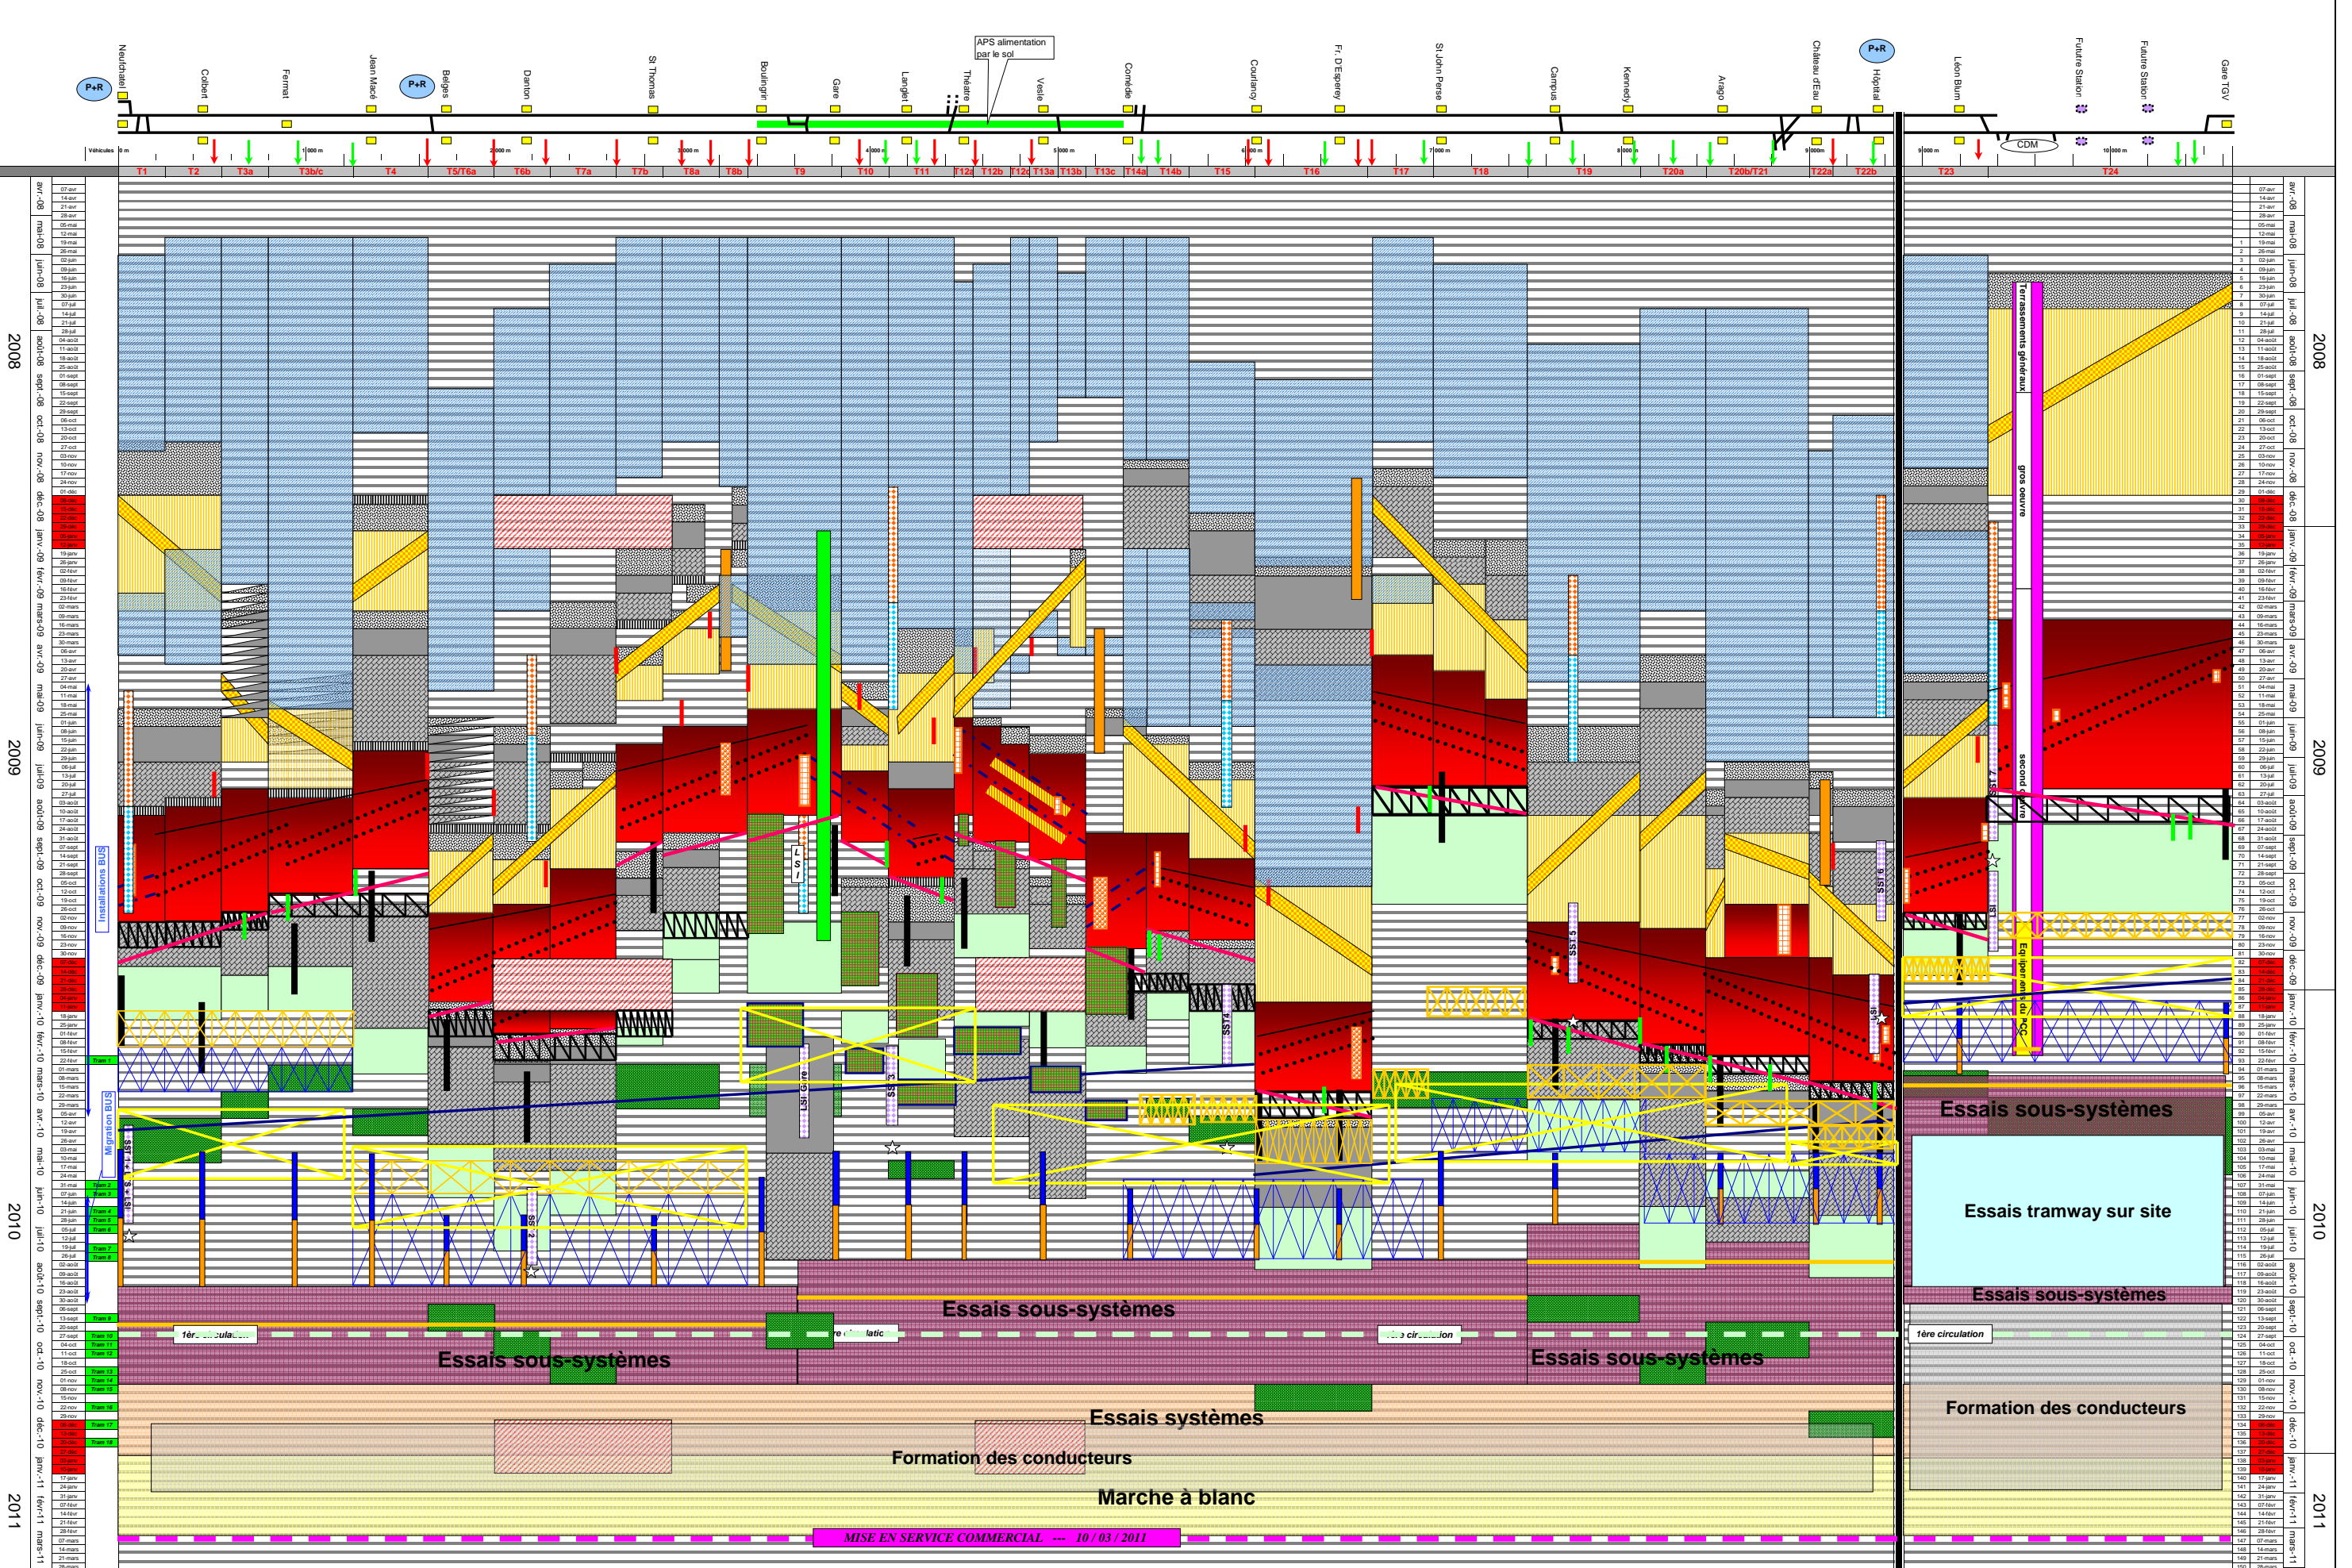

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011
